



Realização



SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PERDAS DE ÁGUA EM MANHUAÇU (MG) - DO INVESTIMENTO AO PROJETO-PILOTO

Autor: Renan Luís Malta Silva





Realização



Introdução

- O presente trabalho se baseia em descrever e detalhar ações executadas antes, durante e depois do edital de chamamento público relativo ao título deste trabalho.
- Mostrar os resultados e levantar discussões acerca da experiência.
- Não foram encontrados modelos similares de editais e investimento a nível municipal e regional associado ao Programa de Redução de Perdas.



Realização:



Introdução

CONHECENDO MANHUAÇU...







Realização



Introdução

POPULAÇÃO – 91.886 habitantes (IBGE, 2022)

FUNDAÇÃO - 1887

REGIÃO – ZONA DA MATA (MG)

CLIMA – TROPICAL DE ALTITUDE

ECONOMIA – Agricultura, comércio, serviços, Instituições de Ensino, Administração Pública



Realização:



Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento





Realização



Objetivo

- Apresentar as ações realizadas pelo SAAE durante as etapas do Programa de Redução de Perdas - AGEVAP/AGEDOCE;
- Explicar as fases do edital de Chamamento Público e os critérios técnicos exigidos;
- Descrever as fases de projeto, implantação, operacionalização e monitoramento do programa.



Realização:



Municipais de Saneamento

MATERIAL E MÉTODOS



Realização



CHAMAMENTO PÚBLICO

Fruto de convênio entre a Associação Pró Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP/AGEDOCE) e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com anuência do CBH-Doce.



Realização



CHAMAMENTO PÚBLICO

 Através do Plano Integrado de Recursos Hídricos, o CBH-Doce alocou recursos para o Programa de Redução de Perdas (P23) – R\$ 5.250.000

 Proveniente da cobrança pelo uso dos recursos hídricos – Lei 9433/97



Realização



BACIA DO RIO DOCE

• 228 municípios

• MG e ES (200 + 28)

Aproximadamente 3,5 milhões de habitantes



Realização:



LINHA DO TEMPO

Agosto/2022 – Lançamento do Edital

Agosto a Novembro/2022 – Inscrições, Habilitação, Hierarquização, Resultado e Homologação

Dezembro/2022 – Celebração de Contrato entre AGEDOCE e Município de Manhuaçu

2023 a 2024 – Elaboração de Termo de Referência



Realização:



CRONOGRAMA

Lançamento	do Edital				
Divulgação do Edital de Chamamento Público	09/08/2022				
Período de inscrição – manifestação de interesse	De 09/08/2022 a 26/09/2022				
Divulgação dos Inscritos	27/09/2022				
Habilitação e Hi	erarquização				
Análise da documentação	De 28/09/2022 a 30/09/2022				
Divulgação do resultado preliminar	03/10/2022				
Prazo recursal do resultado preliminar	De 04/10/2022 a 06/10/2022				
Análise dos recursos	De 07/10/2022 a 10/10/2022				
Divulgação do resultado	10/10/2022				
Prazo recursal do resultado	De 11/10/2022 a 13/10/2022				
Análise dos recursos	De 14/10/2022 a 18/10/2022				
Divulgação final do resultado	19/10/2022				
Homologação do resultado	19/10/2022				



Realização



ANÁLISE DO EDITAL

- Habilitação e Hierarquização
- Prazos do cronograma
- Sintonia entre Prefeitura e SAAE
- Municípios concorrentes
- Competição



Realização:



FASE 1 - HABILITAÇÃO

- Certidões Estaduais e Federais (CADIN, CAGEC...)
- Ofícios e Declarações
- Comprovantes e Termos de Compromisso
- Desenho da área escolhida para a implantação do projeto
- Anexos no Edital



Realização



ESCOLHA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PILOTO

- Área Total 2,40 km²
- 09 Bairros
- Auxílio do Sistema de Informação Geográfica (GIS) da autarquia
- População a ser atendida Aprox. 23.000 hab




Realização



ESCOLHA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PILOTO

REQUISITOS DO EDITAL:

- Possuir área máxima de 5 km² (item obrigatório)
- Possuir limites físicos conhecidos (desejável)
- Possuir somente uma entrada de água com medição de vazão (desejável)
- Entre outros

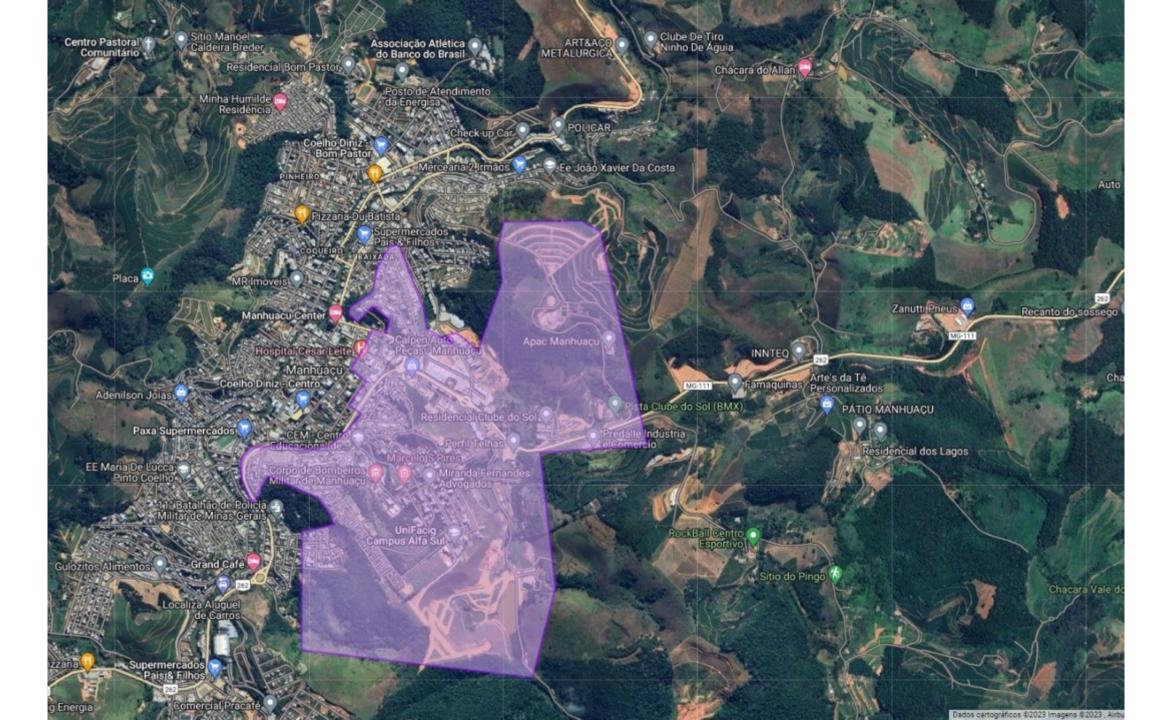



Realização



FORÇA-TAREFA:

- Cerca de 10 servidores
- Engenharia, Administrativo, Contabilidade e Planejamento
- Ações: Executar a Fase 1 (Habilitação) Ver slide 14
- SAAE x Prefeitura x Câmara



Realização:



Municipais de Saneamento

HABILITAÇÃO - RESULTADO

Aimorés	Inabilitado
Guanhães	Habilitado
Ipanema	Inabilitado
Itaguaçu	Habilitado
Itarana	Inabilitado
João Monlevade	Habilitado
Manhuaçu	Habilitado
Raul Soares	Habilitado
São Geraldo do Baixio	Inabilitado
Senador Firmino	Habilitado
Taparuba	Inabilitado
Vermelho Novo	Inabilitado
Viçosa	Inabilitado



Realização:



HABILITAÇÃO - RESULTADO

- 13 municípios inscritos
- 06 habilitados
- 07 inabilitados



Realização



FASE 2 – HIERARQUIZAÇÃO (CRITÉRIOS TÉCNICOS)

- População a ser beneficiada
- IDH
- Índice de Hidrometração
- Consumo Médio Per Capita de Água
- Indicador Volumétrico de Água Perdida na Distribuição



Realização



FASE 2 – HIERARQUIZAÇÃO (CRITÉRIOS TÉCNICOS)

- Índice de Perdas de Faturamento
- Índices de Perdas por Ligação
- Índice de Macromedição
- CRITÉRIO DE DESEMPATE = Menor IDH



Realização:



Municipais de Saneamento

HIERARQUIZAÇÃO - RESULTADO

					CRITÉRIOS TÉC	CNICOS - NOTAS	;	10					
INSCRITO	INSCRITO RESULTADO PRELIMINAR	População beneficiada	IDH	IN009 - Índice de hidrometração	IN011 - Índice de macromedição	IN013 - Índice de perdas faturamento	IN022 - Consumo médio per capita de água	IN049 - Índice de perdas na distribuição	IN051 - Índice de perdas por ligação	NOTA FINAL			
Guanhães	Habilitado	0,469	0,939	1,000	1,000	1,000	0,878	0,338	0,147	0,721			
Itaguaçu	Habilitado	0,219	0,917	0,955	0,000	1,060	0,580	1,000	1,000	0,716			
João Monlevade	Habilitado	1,000	0,850	1,000	0,000	0,945	0,789	0,248	0,081	0,614			
Manhuaçu	Habilitado	0,719	0,924	1,000	0,000	0,000	0,750	1,000	0,462	0,607			
Raul Soares	Habilitado	0,047	0,983	1,000	0,000	0,987	1,000	0,407	0,201	0,578			
Senador Firmino	Habilitado	0,247	1,000	0,999	0,000	0,509	0,868	0,212	0,079	0,489			



Realização:



Municipais de Saneamento

HIERARQUIZAÇÃO - RESULTADO

Inscrito	Classificação	Situação
Guanhães	1º	Contemplado
Itaguaçu	2°	Contemplado
João Monlevade	3°	Contemplado
Manhuaçu	4º	Contemplado
Raul Soares	5º	Contemplado
Senador Firmino	6 º	Suplente



Realização



CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA

- Celebrado em 12/2022. Finaliza em 12/2025
- AGEVAP/AGEDOCE x Município de Manhuaçu x SAAE de Manhuaçu (Interveniente)
- Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal



Realização



Municipais de Saneamento

RESULTADOS E DISCUSSÃO



Realização



Resultados

- 4º lugar entre 13 inscritos;
- R\$ 1.000.000,00 para o município implantar o sistema;

- Garantia de uma etapa que visa promover a redução do índice de perdas e avanços no uso racional da água.



Realização



Discussão

- Valor da Participação da Engenharia nos órgãos públicos de saneamento;
- Importância da adimplência dos municípios junto a outras instituições (Estado, União) para que possam participar e receber investimentos;
- Aproveitamento do projeto-piloto para replicar a outros municípios.



Realização



Conclusões

 Não medir esforços para participar de processos de seleção para captar recursos de investimentos para melhorias no saneamento básico municipal

 Vale a pena capacitar servidores da área do saneamento para atender aos requisitos de editais de chamamento público mais complexos



Realização:



Municipais de Saneamento

2023 - 2024



Realização



SITUAÇÃO ATUAL - 2023/2024

2023 - Elaboração do Termo de Referência e
Orçamento do Projeto pela AGEDOCE aos municípios contemplados.

 2023 – Reuniões entre as partes com o objetivo de coletar informações mais precisas das características da área de implantação do sistema.



Realização



SITUAÇÃO ATUAL - 2023/2024

2024 – Envio do TR e Orçamento do Projeto para

Manhuaçu. Valor Global: R\$ 294.455,01

Prazo de execução: 24 meses

 2024 – Licitação será realizada pelo CISAB nas próximas semanas.

Modalidade: Concorrência

Tipo: Técnica e Preço



Realização



ORÇAMENTO – PRODUTOS

Produto 1: Diagnóstico e Levantamento de Dados

Produto 4: TDR e Projeto Executivo

Produto 6: Implantação de Sensores

Produto 12: Acompanhamento técnico da licitação pelo

município

Produto 14: Capacitação da equipe de saneamento



Realização



TERMO DE REFERÊNCIA

- Requisitos de Contratação
- Objetivos
- Metodologia
- Detalhamento dos Produtos
- Especificações Técnicas



Realização:



Referências

AGEDOCE: www.agedoce.org.br

CBH-DOCE: www.cbhdoce.org.br

IBGE: www.ibge.gov.br

SNIS: www.snis.gov.br



Realização



Agradecimentos

Senisi Rocha

SAAE – Manhuaçu (MG)

Prefeitura Municipal de Manhuaçu (MG)

ASSEMAE e Comissão Avaliadora



Realização:



OBRIGADO!

Renan Malta





